Activity ID	Verkþáttur	Dagar	Byrjar	Lýkur	Áætl. kost.	Ábyrgur
FRAMKVÆMDIR						
FRAMKVÆMDIR						
Aðstaða						
320	Aðstöðusköpun	20	01.05.08	20.05.08	9	
380	Rekstur vinnusvæðis	816	21.05.08	29.05.11	40	
Jarðvinna						
230	Grafið fyrir undirstöðum	45	21.05.08	17.07.08	7	
340	Jarðvinna vegna lagna	40	04.07.08	28.08.08	7	
330	Fyllingar	40	17.10.08	11.12.08	12	
Burðarvirki						
240	Uppsteypa kjallara	90	04.07.08	06.11.08	39	
350	Uppsteypa 1. hæð	110	10.10.08	16.03.09	87	
360	Uppsteypa 2. hæð	110	17.02.09	06.07.09	87	
Lagnir						
250	Lagnir í jörð	40	15.08.08	09.10.08	1	
410	Lagnir kjallara	150	10.11.09	28.05.10	8	
390	Lagnir 1. hæð	150	09.05.10	24.11.10	19	
400	Lagnir 2. hæð	142	16.09.10	01.04.11	20	
Loftræsikerfi						
260	Loftræsing kjallara	150	10.11.09	28.05.10	7	
420	Loftræsing 1. hæð	150	09.05.10	24.11.10	15	
430	Loftræsing 2. hæð	142	16.09.10	01.04.11	16	
Frágangur utanhúss						
280	Frágangur utanhúss	200	09.06.09	17.03.10	73	
Frágangur innanhúss						
290	Frágangur kjallara	150	10.11.09	28.05.10	25	
460	Frágangur 1. hæð	120	09.05.10	13.10.10	56	
470	Frágangur 2. hæð	142	16.09.10	01.04.11	56	
Rafkerfi						
270	Rafkerfi í kjallara	150	10.11.09	28.05.10	12	
440	Rafkerfi 1. hæð	150	09.05.10	24.11.10	15	
450	Rafkerfi 2. hæð	142	16.09.10	01.04.11	27	
Lóðarfrágangur						
370	Bílastæði á lóð	62	21.05.08	11.08.08	10	
300	Lóðarfrágangur	110	01.03.11	19.07.11	27	
Breytingar á núverandi húsnæði						
310	Rif á skrifstofurými	10	21.05.08	30.05.08	7	
520	Brot á gólfum og gröftur í	20	20.06.08	17.07.08	10	
480	Breytingar kjallara	41	15.04.10	29.05.10	37	
490	Breytingar 1. hæð	86	04.04.11	19.07.11	99	
500	Breytingar 2. hæð	56	11.05.11	19.07.11	34	
510	Breytingar 3. hæð	56	11.05.11	19.07.11	1	

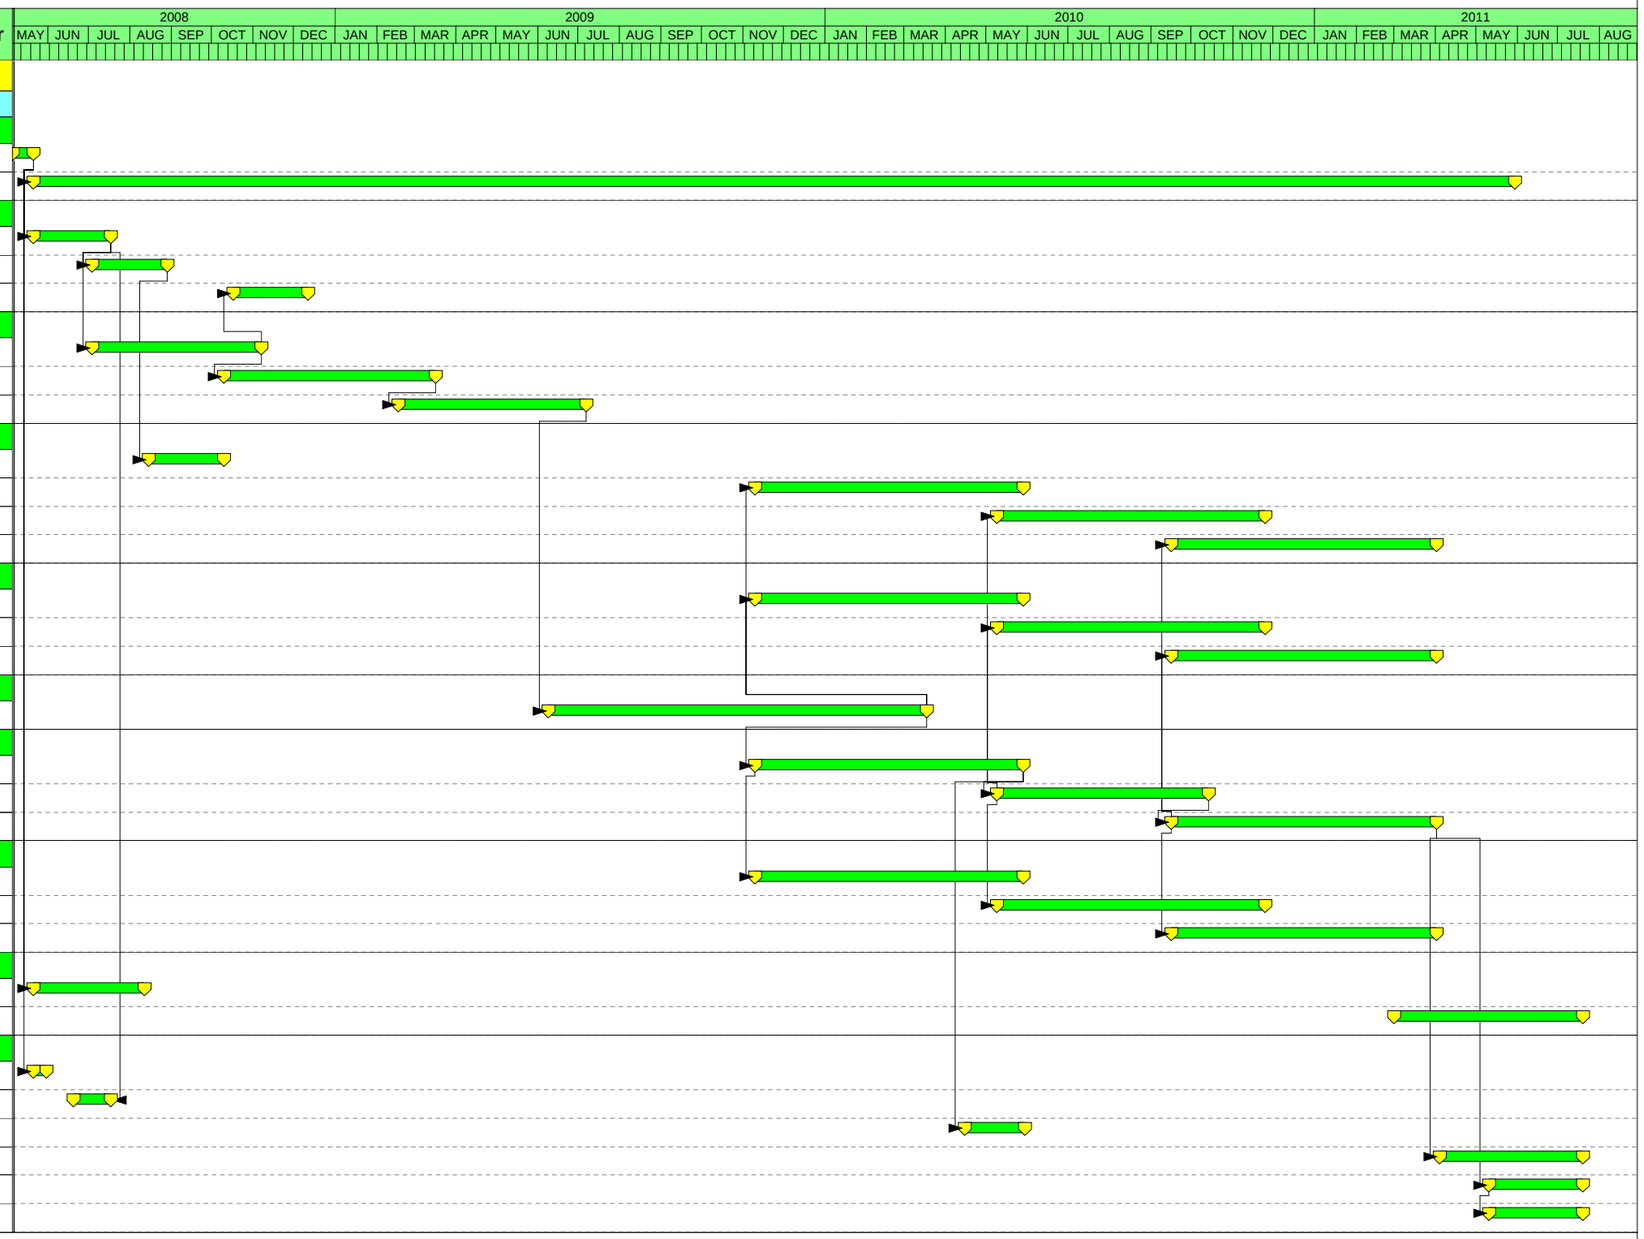

Date	Revision	Checked	Approved
19.02.08			

VIÐBYGGING OG BREYTINGAR Á NÚVERANDI BYGGINGU

Start date	01.05.08
Finish date	19.07.11
Data date	01.05.08
Run date	04.03.08
Page number	1A

© Primavera Systems, Inc.
